



Til
Grunneiere iht. liste

Asker, mars 2019

Rehabilitering VA J.R. Wilhelmsens vei og omegn, område 3 **INFORMASJON OM FREMDRIFTSPLAN FOR ANLEGG SARBEIDENE**


Entreprenør Marthinsen & Duvholt AS starter nå opp arbeidet i område 3, i henhold til plan og tidligere informasjonsskriv. Bleikeråsen stenges for gjennomkjøring nedenfor Leangkollen hotell, og skilting settes opp for dette mandag 1. april 2019.

Fremdriftsplan

I første omgang gjøres forberedende arbeider som etablering av brakkerigg i Bleikeråsen, skilting og sperringer av vei, innmålingsarbeid og grunnundersøkelser, samt etablering av provisorisk vann og avløp.

Anleggsarbeidet er planlagt inndelt i fire hovedfaser som indikert i Figur 1;

- Fase 1; Langenga og nedre del av Bleikeråsen
- Fase 2; Bleikeråsen mellom Slettagata og Leanglia
- Fase 3; Øvre del av Bleikeråsen
- Fase 4; Slettagata

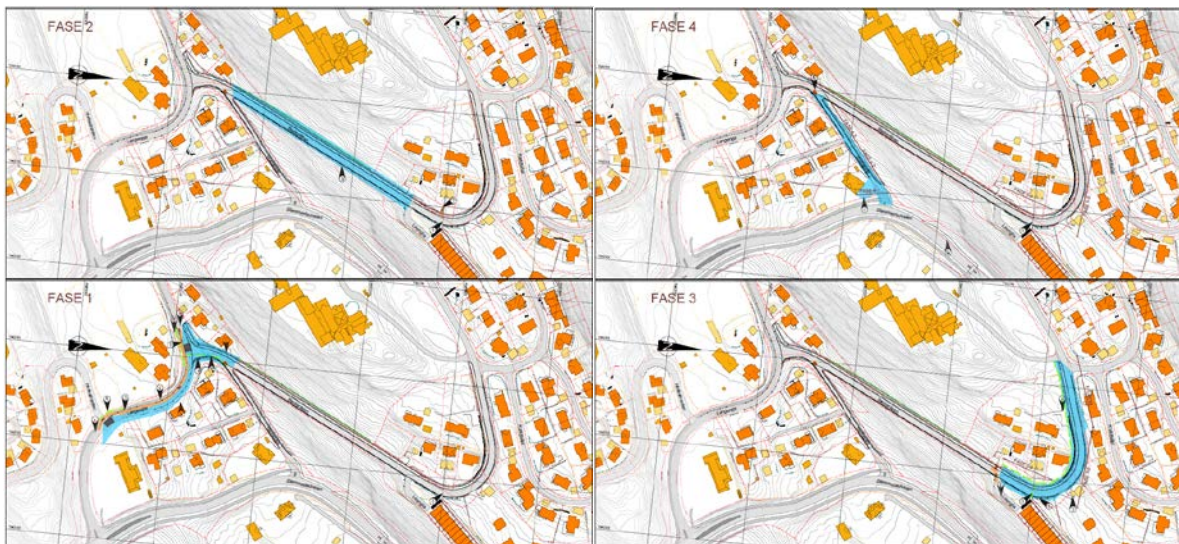

Figur 1 – Faseinndeling i område 3

Anleggsarbeidet er planlagt å starte 1. april 2019, og vare til oktober 2020. En fremdriftsplan er vedlagt her til informasjon. Merk at tidspunkt og varigheter er foreløpige, og at endringer vil kunne forekomme, også med hensyn til rekkefølgen for ulike faser. Spesielt fase 4 kan i



større grad gjennomføres parallelt med andre faser. Oppdatert informasjon om fremdrift vil sendes ut underveis i anleggsfasen.


Det vil være stans i arbeidet i påsken, i perioden fra 12. april til 23. april 2019.

Trafikkavvikling

I forbindelse med anlegget vil fremkommeligheten i området bli endret. Bleikeråsen stenges for gjennomkjøring i perioden arbeidene pågår, fra april 2019 til september 2020, men det vil tilrettelegges for passasje for myke trafikanter. Adkomsten til hver eiendom opprettholdes så langt det lar seg gjøre. Det vil være stort fokus på fremkommelighet i anleggsperioden, samt sikkerhet til beboere, gående og syklende.

Minst ett felt vil til enhver tid søkes opprettholdt i Langenga. Lysregulering i Langenga er planlagt fra april 2019 til september 2019. Bommen i Slettagata vil i en periode åpnes for biltrafikk til eiendommene der.

Skiltplan for fase 1 og forberedende arbeider er vist i Figur 2.

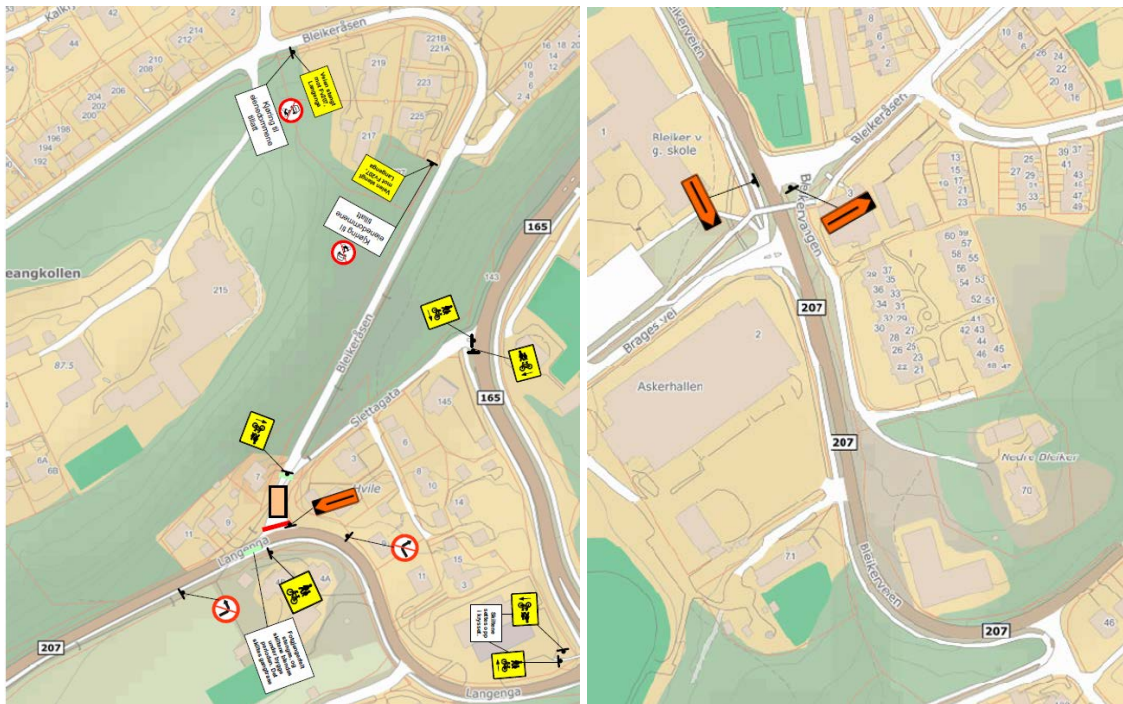


Figur 2 – Skiltplan forberedende arbeider og fase 1

Vannavslag

I løpet av anleggsperioden vil det bli noen vannavslag. Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresser vil bli varslet. For å sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke oppføring.

Hjemmesiden til prosjektet:

Gå inn på web siden til Asker kommune (www.aker.kommune.no) og søk på J.R. Wilhelmsens vei, da kommer hjemmesiden til prosjektet opp. Alle informasjonsskriv som sendes ut i prosjektet legges ut på hjemmesiden.



Prosjektet har også en egen Facebook side, «Rehabilitering VA J.R. Wilhelmsens vei og omegn», som finnes ved å søke på VA.JRW.

Planlagt fremdrift	Kontaktpersoner
Oppstart anleggsarbeider: April 2019 Planlagt ferdigstillelse: Oktober 2020	Byggeleder: Navn: Roger Eilertsen Mobil: 966 27 925 e-post: roger.eilertsen@multiconsult.no Kontrollerende Utførende (KU): Navn: Erik Gulbrandsen Mobil: 949 79 335 e-post: eg@hrprosjekt.no Prosjektleder: Navn: Karin Ryssdalsnes e-post: karin.ryssdalsnes@asker.kommune.no Entreprenør Marthinsen og Duvholt AS: Navn: Kim Horntvedt e-post: kim@mogd.no

